



RHÔNE – CHÔMAGE(S) NAVIGATION (MARS 2023)

PRESENTATION DES PRINCIPALES
OPERATIONS REALISEES

CNR

HAUT-RHÔNE

06 Mars – 31 Mars 2023 : Ecluse de SAVIERES

30 Mars – 31 Mars : Ecluses de BELLEY Amont, BELLEY Aval et CHAUTAGNE Aval


20 Mars – 12 Avril (extension au 21 Avril) : Ecluse de CHAUTAGNE Amont

Batardages et mises hors d'eau :

Savières,

Belley Amont

Chautagne Aval

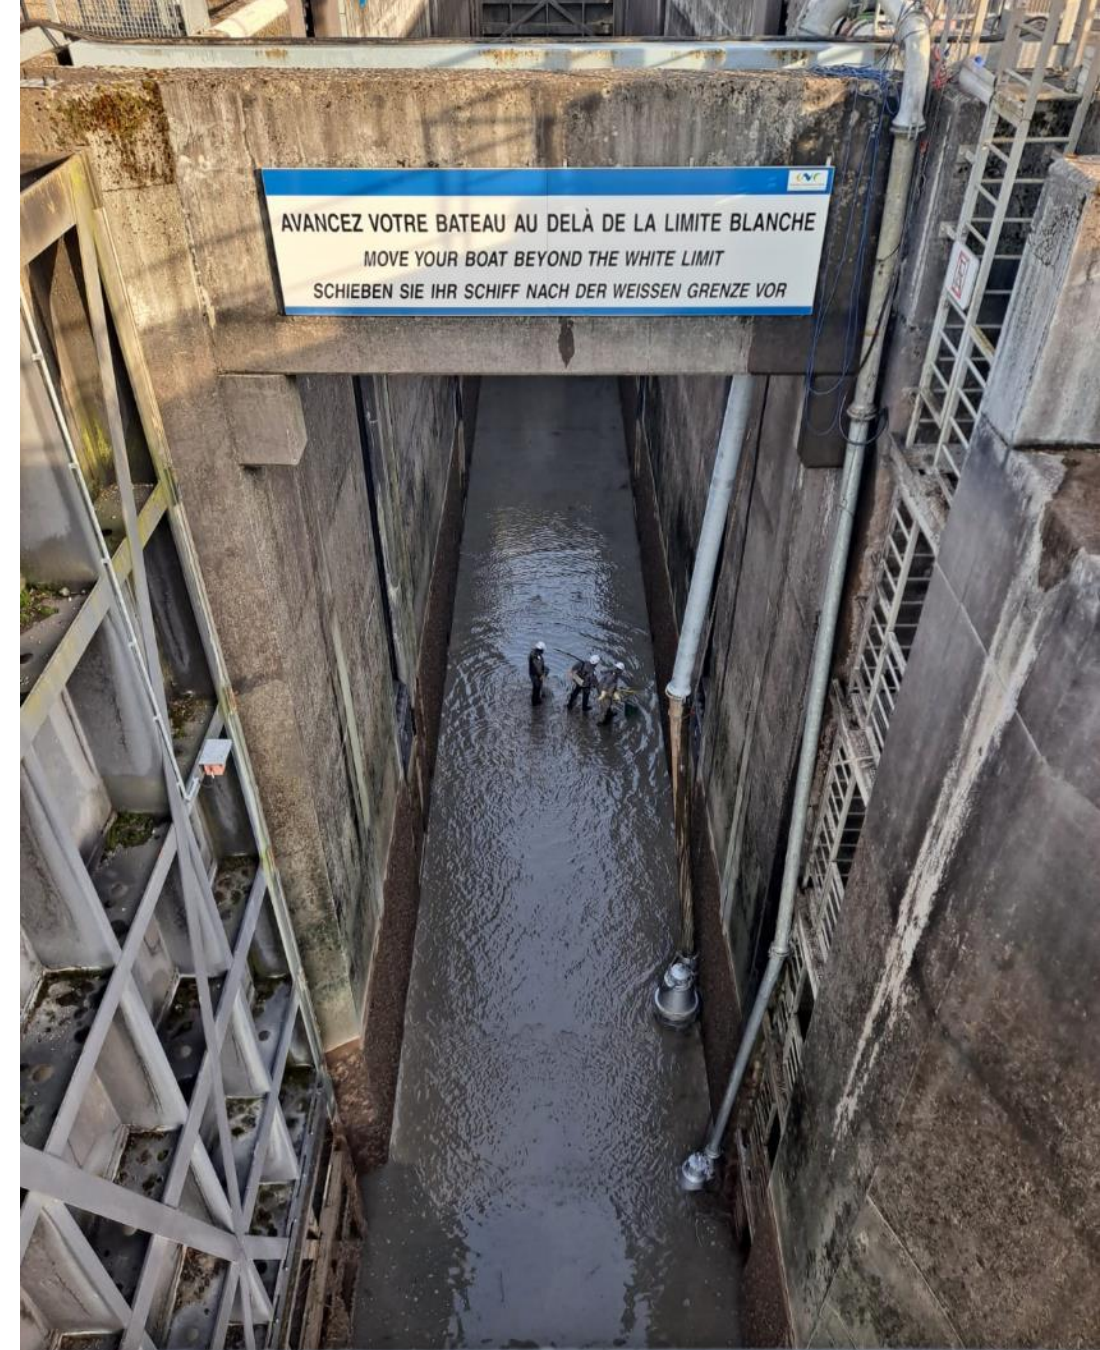


HAUT-RHÔNE

TRAVAUX ET EXPERTISES

Ecluses de Chautagne aval et Belley : Expertises des portes

Ecluse de Savières : Travaux sur les portes : remplacement des vérins de manœuvres, des vérins de vannes des crapaudines

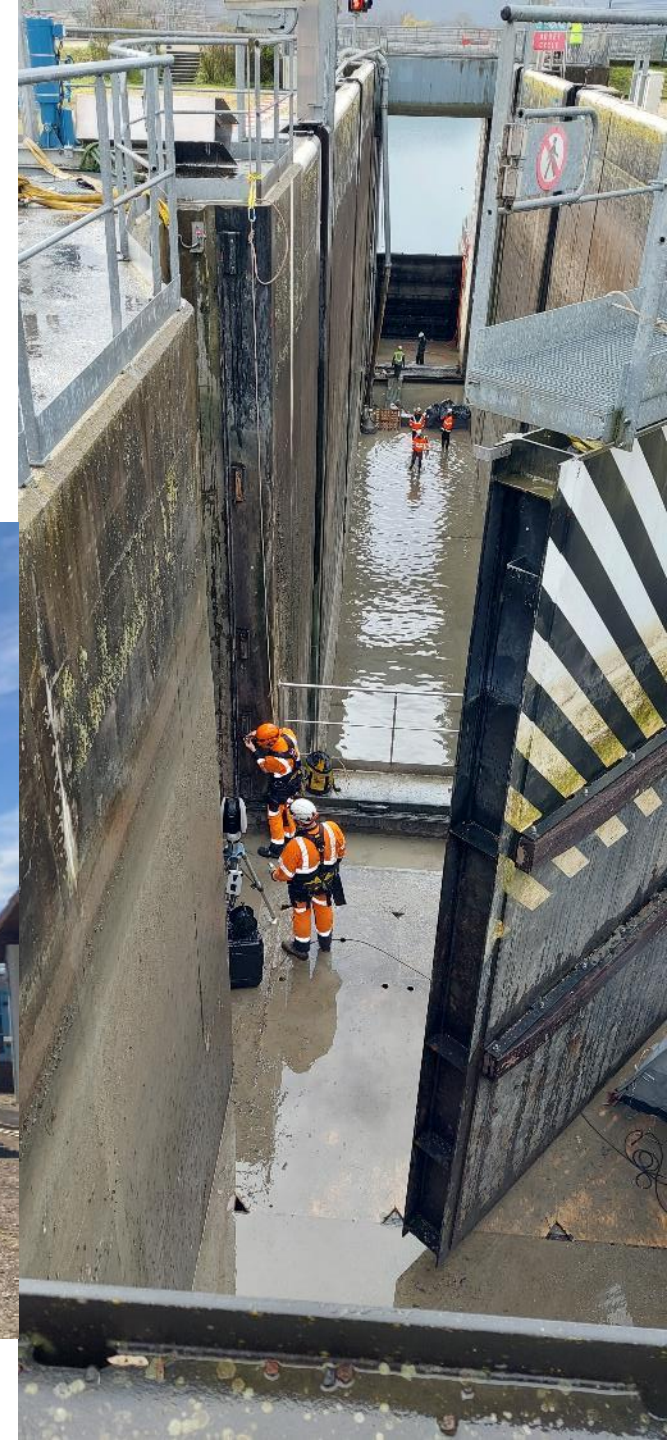

BAS-RHÔNE

ECLUSES DU BAS-RHÔNE, y.c. BARCARIN : 05 Mars (21h) - 16 Mars 2023 (05h)
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE : 19 Mars (21h) – 30 Mars (21h)

Vidange sas et
acqueducs

Mise hors
d'eau organes
immergés

Nettoyage SAS
et bouchures
(expertises)




BAS-RHÔNE

PIERRE-BENITE :

Réfection peinture de la face amont de la porte aval ---->

Remise en place de la Porte Batardeau Amont après rénovation


↓ complète (vantaux et pièces fixes)

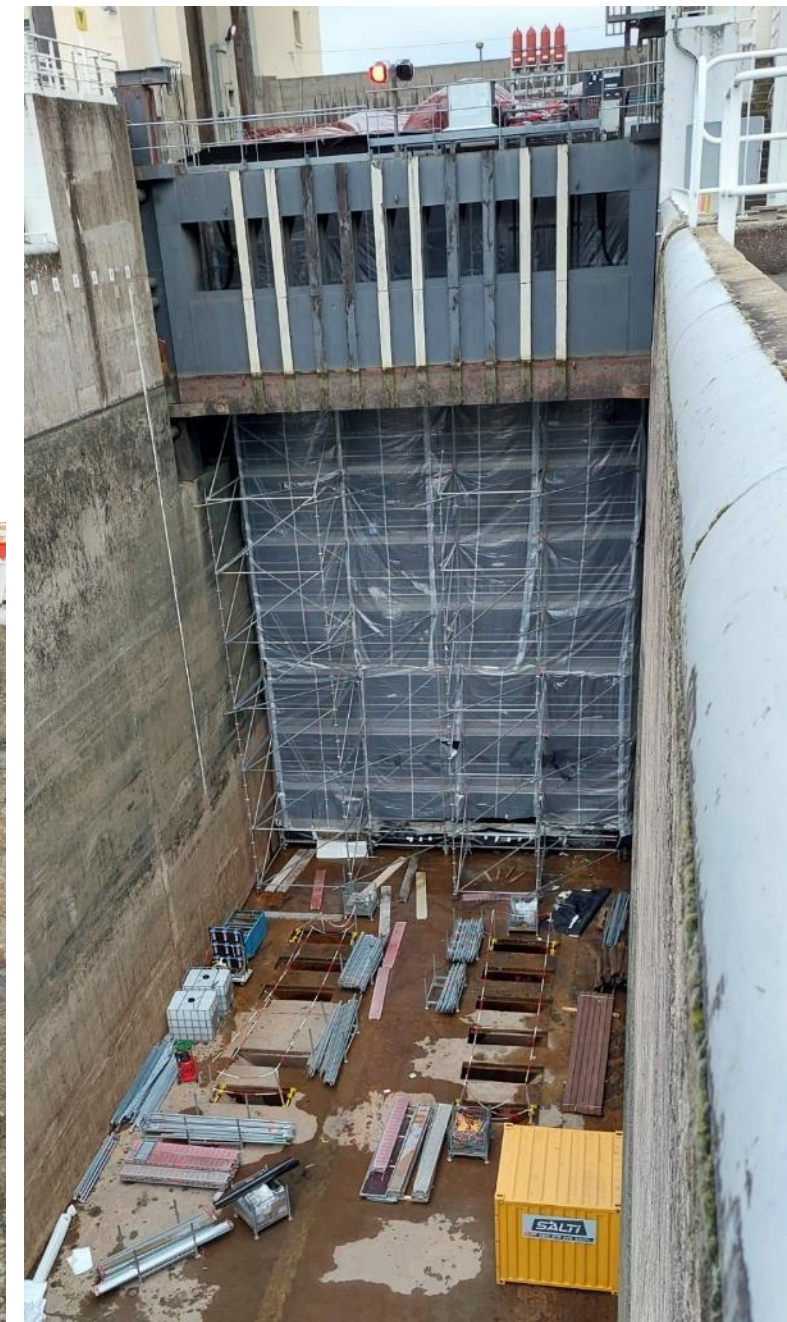

BAS-RHÔNE - VAUGRIS

PORTE AMONT (Dégagement Latéral Coulissante): Remplacement des 2 chasses-boues et des boîtes à galets →

↓ PORTE AVAL : Remplacement des rails inférieurs de roulement

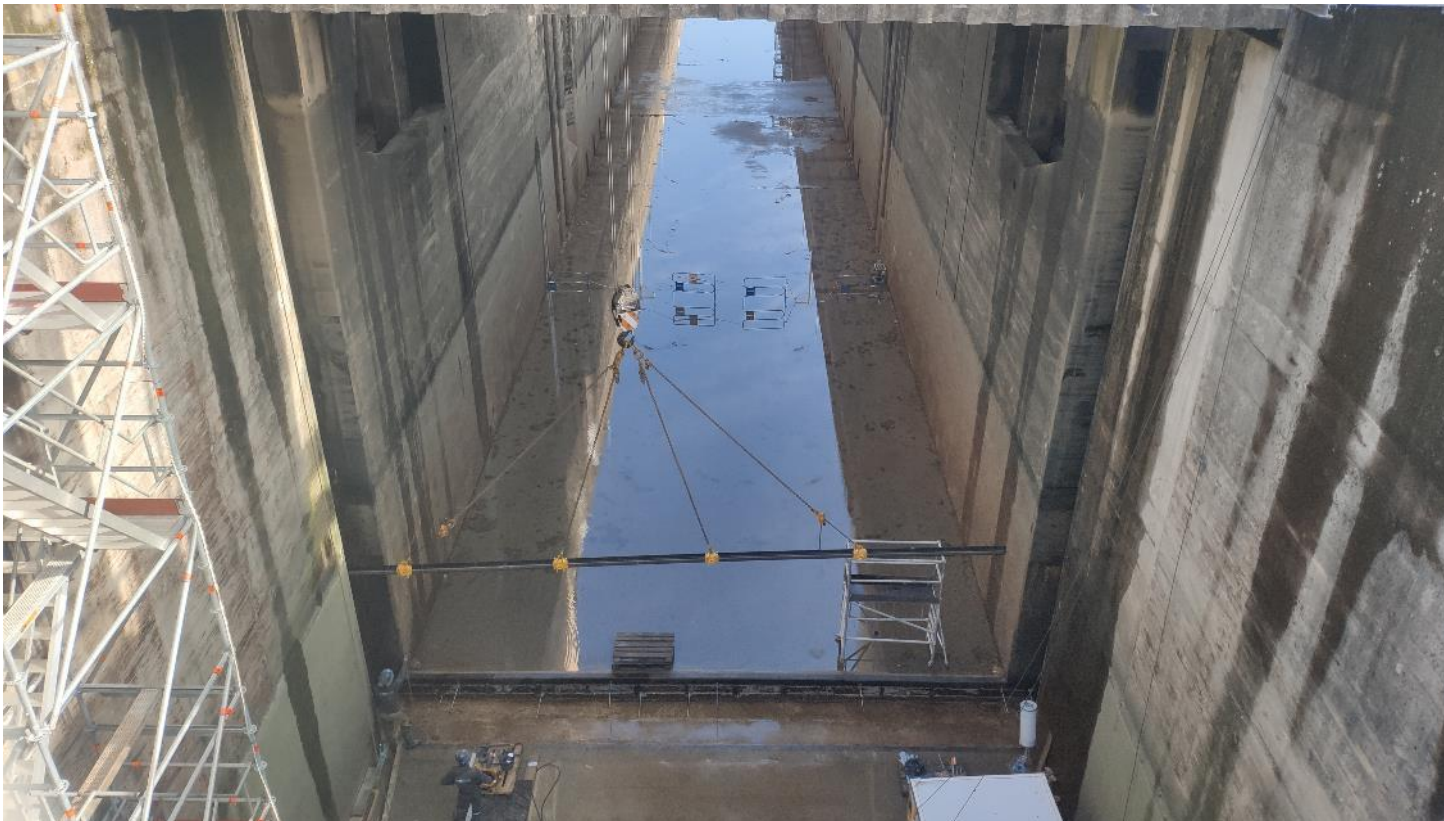

BAS-RHÔNE



GERVANS

Remise en place
des vantaux de
la porte aval
busquée



BAS-RHÔNE



MO – Guidage Amont RG



MO – Guidage Amont RD



BV : mur guide aval




MO : Guidage-Protection Vantail PBAM

BAS-RHÔNE

BEAUCHASTEL : reprise des
parements amonts merlon et
canal d'amenée



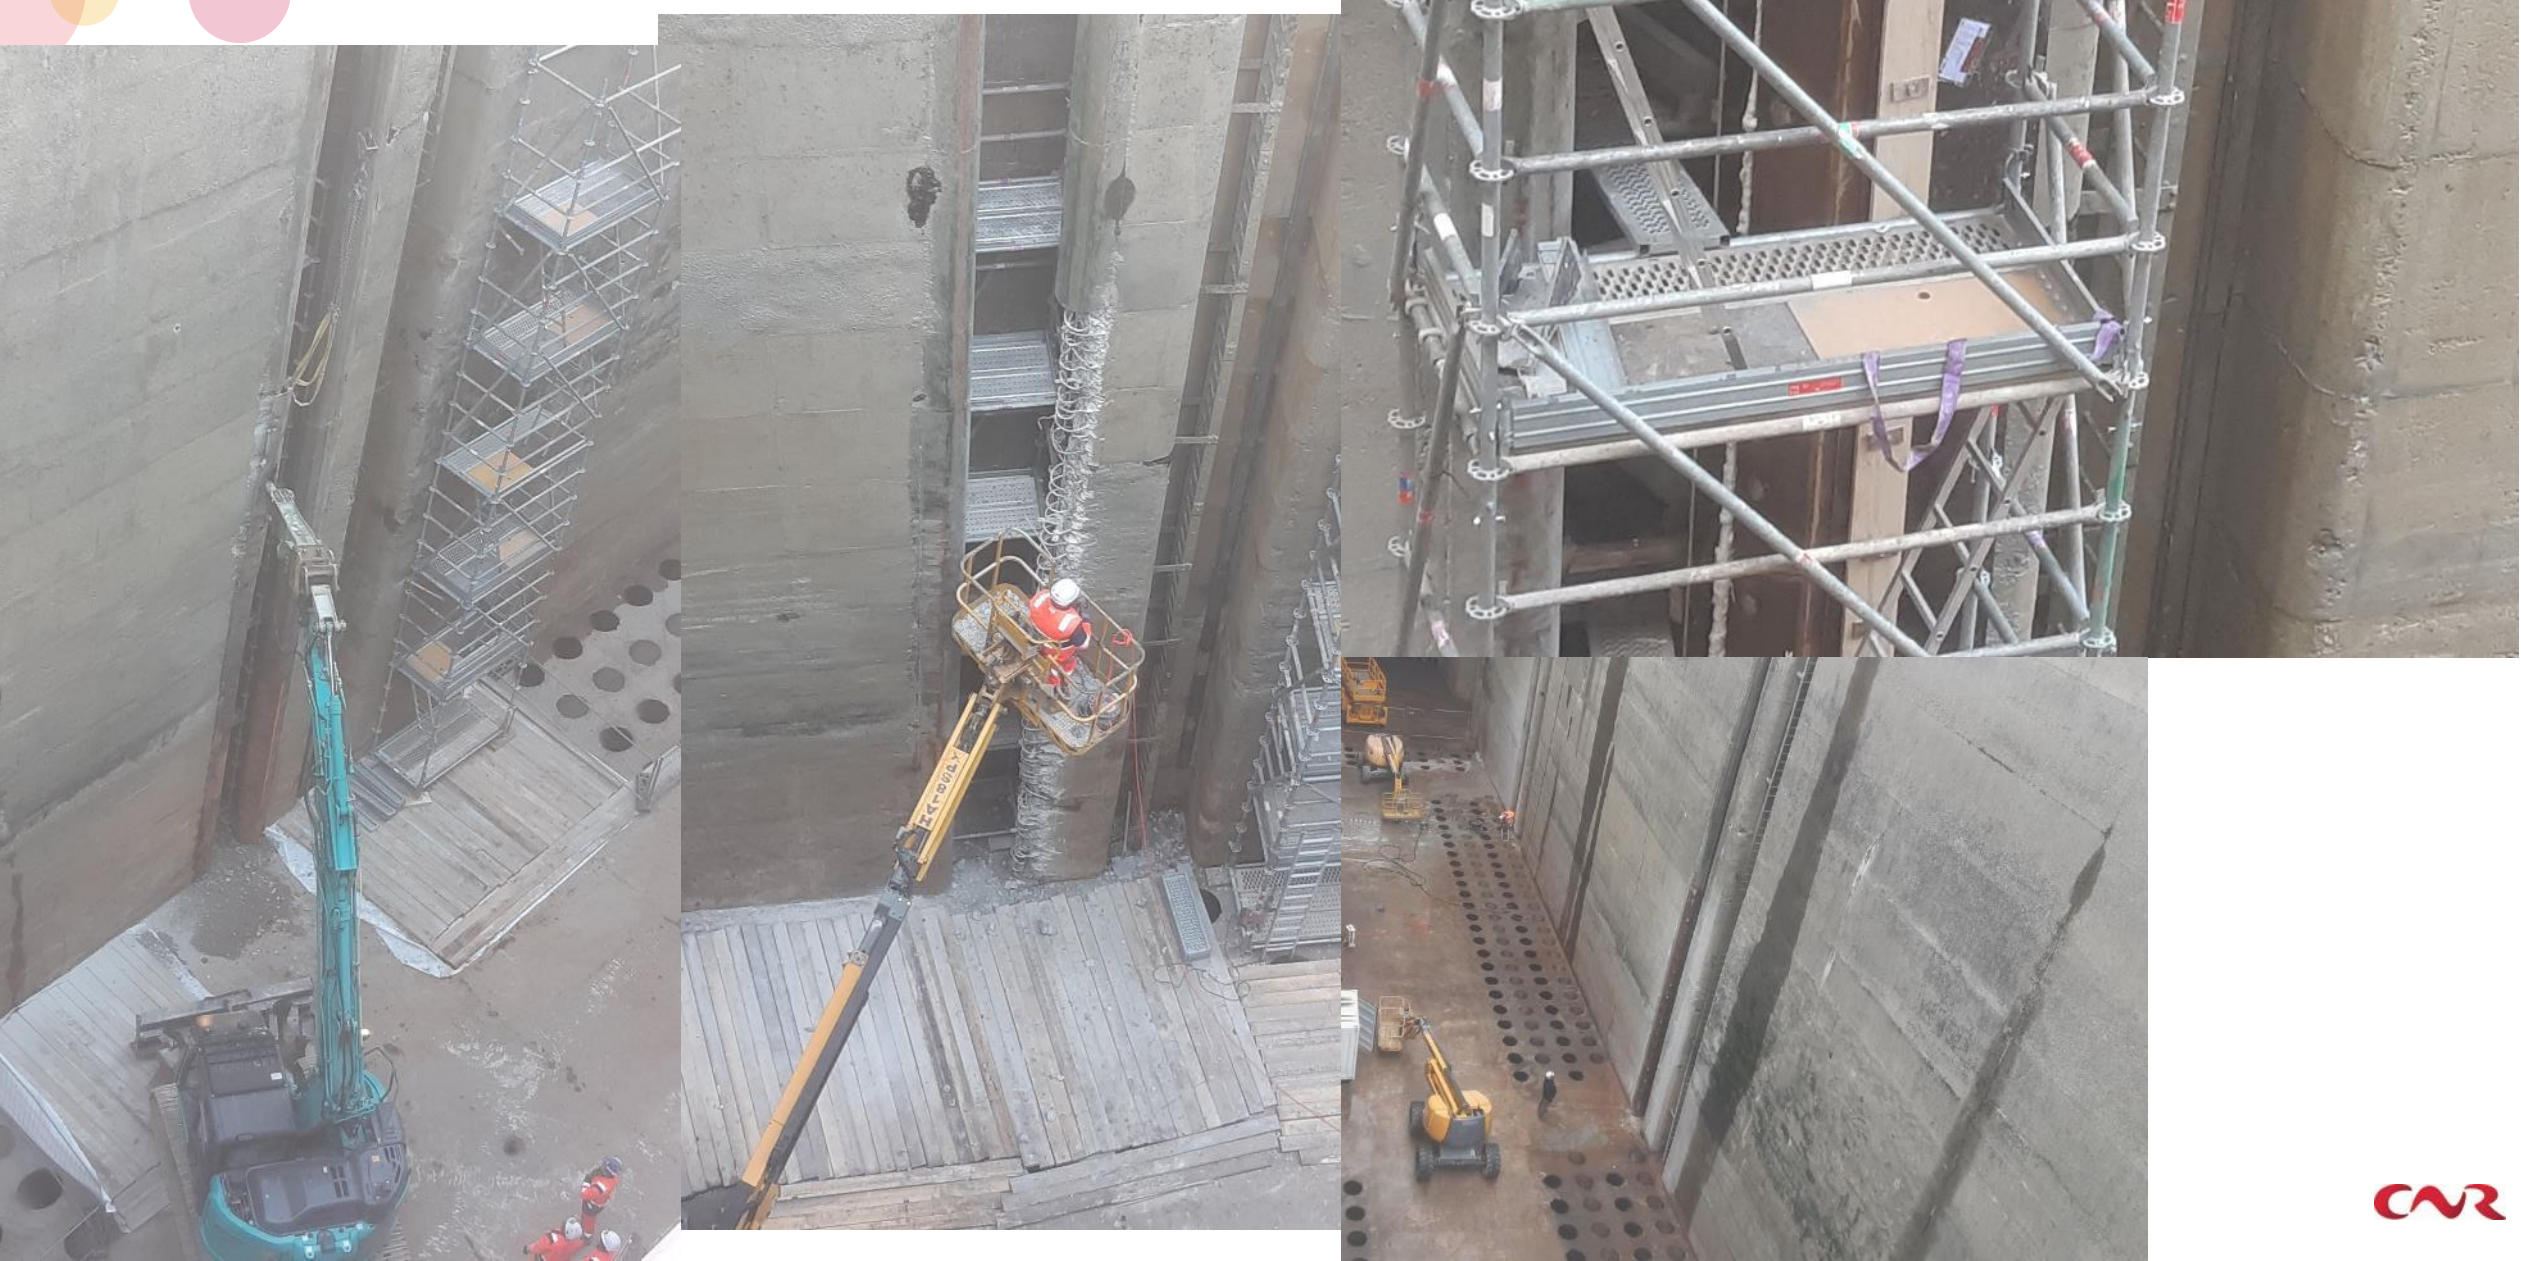

BAS-RHÔNE

Châteauneuf-du-Rhône : Réfection étanchéité Masque Porte aval



BAS-RHÔNE

Pêle-mêle : autres opérations électromécaniques

BV – Porte aval (plate levante): Remplacement des galets de déplaquage

BE - Pare-choc sas : remplacement amortisseurs

LN – Porte amont (busquée): fin de travaux sur étanchéités latérales

BO – Porte amont (baissante) : fin des travaux mécaniques sur chaîne cinématique (noix menée et palonniers)

BO – Porte aval (levante en arc): Reprise anti-corrosion des béquilles (structure)


CA et PSL : Amélioration Système vidéo (passage en caméras numériques)

AV – Portes amont et aval (coulissantes): remplacement des boîtes à galets

BC – Porte amont (baissante): expertise rails, poulies et câbles

BA – Porte aval (busquée) : remplacement des vérins de manœuvres

PSL – Pont levant : remplacement vanne de commande proportionnelle et vérin de commande amont

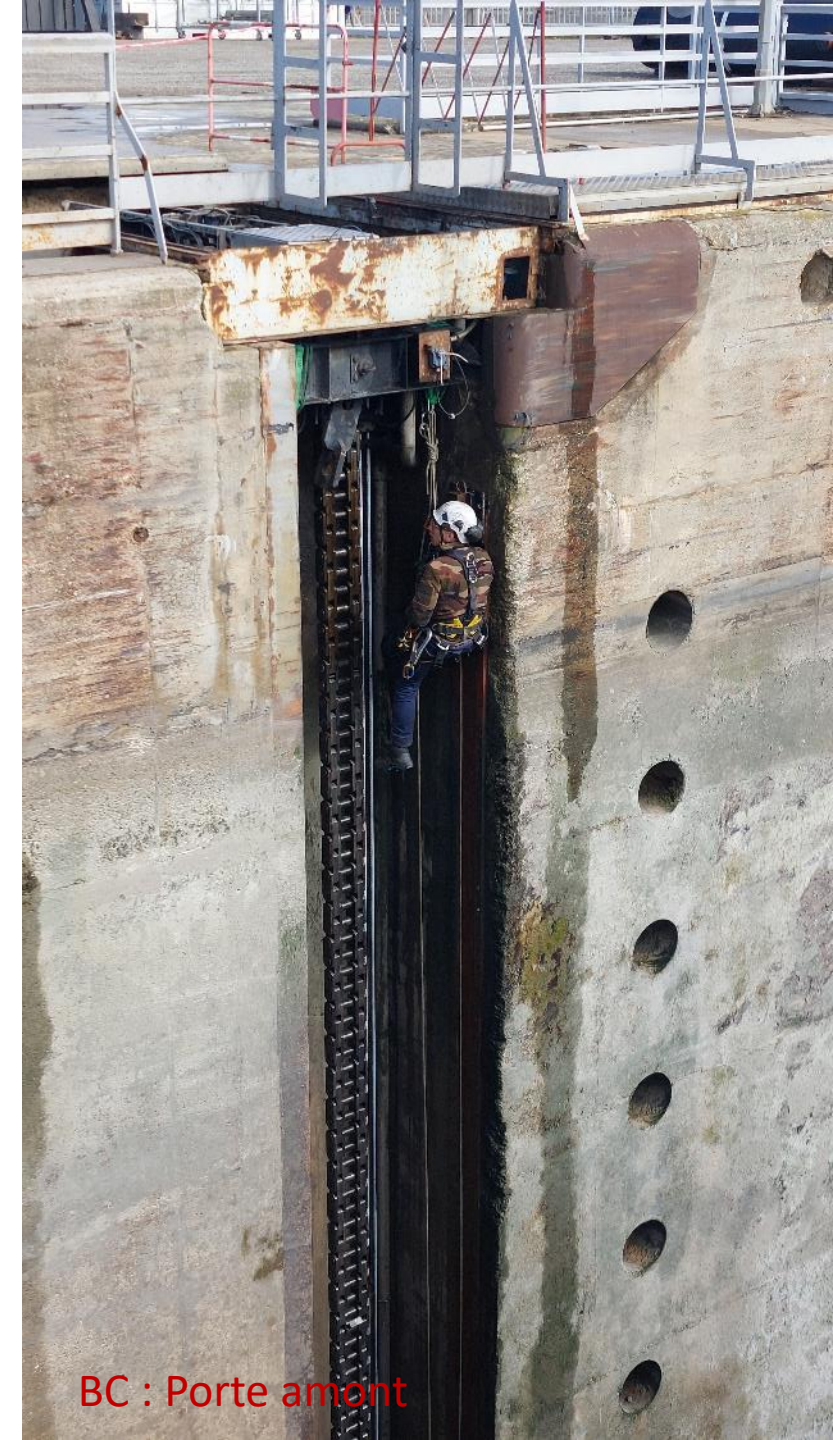

BC : Porte amont

L'énergie au cœur des territoires

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

CNR

cnr.tm.fr

