


Principaux travaux de la Direction territoriale Rhône Saône



Les ouvrages de la grande Saône

- La création de stationnements pour bateaux de logements quai des étroits et Fulchiron
- La création d'appontement à Saint-Jean-de-Losne et Verdun-Ciel
- La régénération des bollards fixes et la création de lisses d'amarrage sur les 5 écluses de la grande Saône

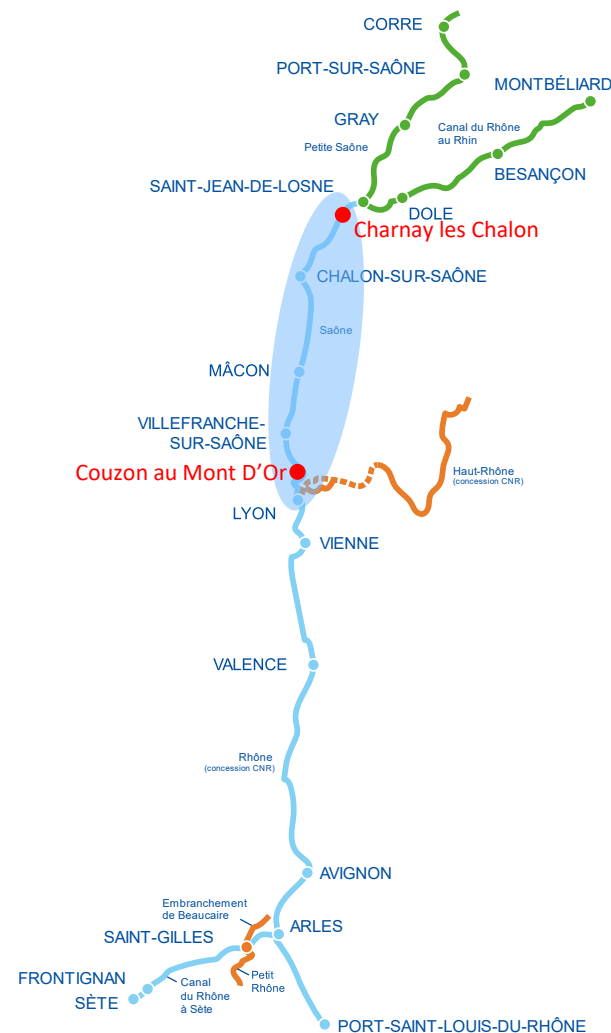

Les ouvrages de la grande Saône

- Création de stationnements pour bateaux de logements quais des Etroits et Fulchiron



- Conception/instruction dossiers réglementaires : 2025
- Lancement des travaux 2026

Les ouvrages de la grande Saône


- Création d'un appontement à Saint-Jean-de-Losne pour le stationnement de courte durée de bateaux de plaisance



- Conception/instruction dossiers réglementaires : 2025
- Lancement des travaux 2026

Les ouvrages de la grande Saône

- Création d'un appontement à Verdun-Ciel pour le stationnement des péniches-hôtels

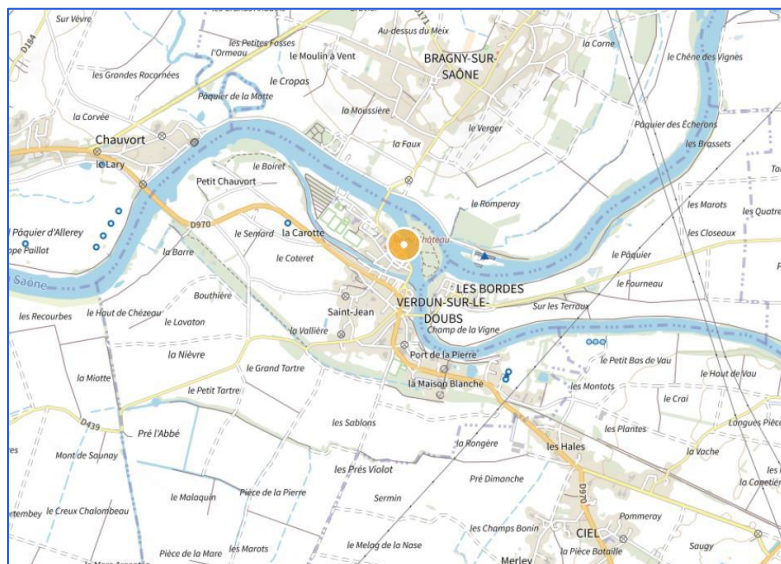

- Conception/instruction dossiers réglementaires : 2025
- Lancement des travaux 2026





Les ouvrages de la grande Saône


- **La régénération des bollards fixes et la création de lisses d'amarrage sur les 5 écluses de la grande Saône**
 - **Projet :**
 - Remplacement des anciens bollards dont la capacité est insuffisante pour l'amarrage des péniches de fret (risque, pour les personnels et les usagers, de sectionnement et de projection des bollards lors de l'amarrage)
 - Création de systèmes d'amarrage linéaire vertical inscrits dans le bajoyer pour les bateaux de plaisance
 - Mise en place de sorties sécurisées d'échelles de sas
 - **Calendrier :**
 - Phase Etudes : 2025
 - Phase Travaux : 2026-2027-2028



Les ouvrages de la petite Saône


- Le tunnel de Saint-Albin

Travaux terminés en septembre

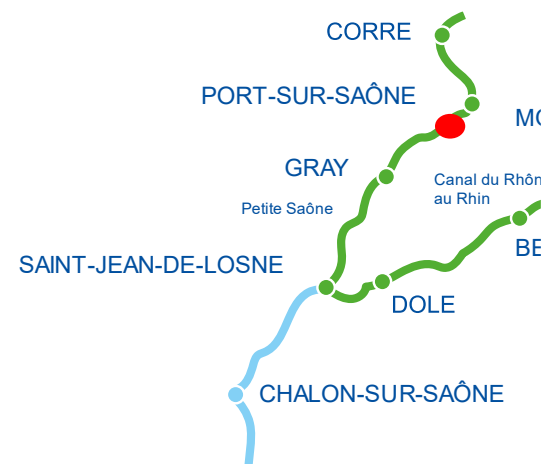

Les ouvrages du canal du Rhône au Rhin

- Le barrage d'Avanne
- Les berges et le mur du « Moulin des malades » à Ranchot

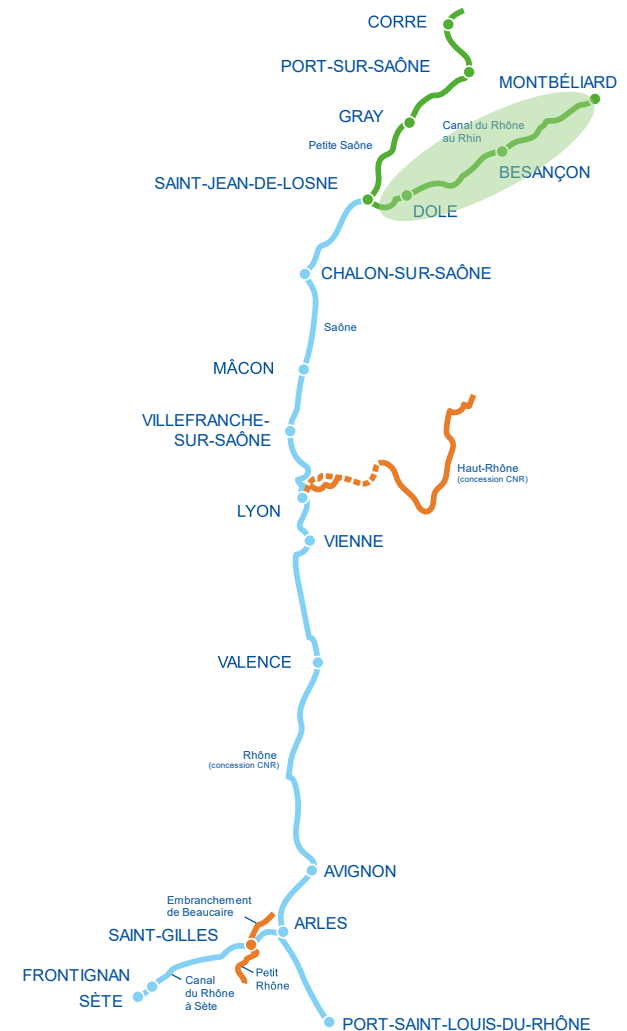

Les ouvrages du canal du Rhône au Rhin

- **Le barrage d'Avanne:**
 - 2025 : Poursuite des études pour le confortement du barrage avec création d'une passe à poisson
 - 2025/2026 : échanges Centralier, Police de l'eau et ABF
 - Travaux envisagés en 2027



Les ouvrages du canal du Rhône au Rhin

- Réfection des berges et du mur du « Moulin des malades » à Ranchot :
- 2025 : études
- 2026 : Réfection des berges (intervention terrestre)
- 2027 : Réfection du mur





Les ouvrages du canal du Rhône à Sète

Modernisation des portes du Vidourle et de la passerelle

Approfondissement et fiabilisation du programme d'ici le début 2026

Recrutement d'une MOE en 2026

Plusieurs périodes de chômage élargies sont à prévoir pour la réalisation des travaux (travaux envisagés entre 2028 et 2030)

Etudes pour la restauration des berges héraultaises du CRS incluant l'élargissement des courbes de Maguelone

Restitution du programme définitif et des études AVP été 2026

Travaux prévus entre 2028 et 2033

Réhabilitation des portes de l'écluse de Saint-Gilles

Études en cours pour préparer la réhabilitation des portes de l'écluse de Saint-Gilles.

Une période de chômage élargie est à prévoir pour la réalisation des travaux (travaux envisagés entre 2028 et 2030).

